



C/157 Básico (Cesión Lic. 12/2021). Contrato 28/09/2023. Rehabilitación de Ruta N° 4, tramo Ruta 31 (79K500) – A° Arapey Chico (118K500).


INFORME AMBIENTAL FINAL.

El presente Informe Ambiental Final tiene como objetivo resumir y confirmar, mediante gráficos, fotos y remitos, las tareas a realizar para la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la ejecución del contrato C/157 Básico (Cesión Lic. 12/2021). "Rehabilitación de Ruta N° 4, tramo Ruta 31 (79K500) – A° Arapey Chico (118K500)." especificadas en el PARA (plan de Recuperación Ambiental).

1. Identificación de zonas afectadas por las instalaciones y actividades involucradas en la ejecución de las Obras.

Se identifican 3 zonas de interés para este documento.

- Zona de ejecución de las obras, Ruta N°4 entre la Ruta N°31 (79K500) y el A° Arapey Chico (118K500) en el departamento de Salto.
- Zona de campamentos, taller, obrador e instalación, Padrón N°1085 de la 4ª SC de Salto progresiva 87K200 y Padrón N°425 de la 7ª SC de Salto, Ruta 4 progresiva 105K400
- Canteras de material Granular explotadas por la empresa para el presente contrato:
Cantera 1 – Padrón N°1085 de la 4ª SC de Salto, Ruta 4 progresiva 87K200 a (+) UTM 21 S 491666 ; 6543442
Cantera 2 – Padrón N°425 de la 7ª SC de Salto, Ruta 4 progresiva 105K400 a (+) UTM 21 S 601713 ; 6557127

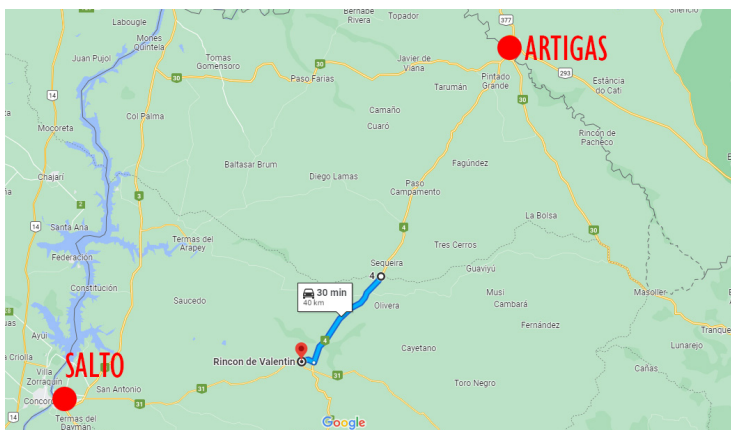

Zona de Obra / Zona de Obrador y Cantera

2. Tareas de Recuperación Ambiental para cada una de las zonas definidas.

Zona de Ejecución de Obras:

- Toda la extensión de la obra, es recorrida verificando el correcto funcionamiento de cunetas y alcantarillas.
- En el talud y contratalud, afectado por la ejecución de las obras es revestido con suelo pasto. Para el cierre de la obra, estos presentan un correcto empastado garantizando evitando erosiones.
- Toda la extensión de la obra es recorrida, removiendo cualquier elemento extraño, sean residuos, montículos de materiales acopiados, elementos de señalización no deseados, etc.

Zona Cantera:

- Para el cierre de la cantera se verifica la seguridad de los taludes generados en el predio por la extracción.
- Se conforman espejos de agua a solicitud de los propietarios de los predios.
- Se realizará chequeo para asegurar el retiro de todo elemento extraño al predio, que pudiera queda de la etapa de obra.


- Se recompone la cubierta de tierra negra en la totalidad de la superficie intervenida, suavizando la topografía y generando una cubierta de material orgánico que favorezca el empastado, salvo zonas puntuales convenidas con los propietarios de los predios.

Las tareas descritas anteriormente son realizadas en su totalidad. Si bien en ambos predios, tanto en el padrón N°1085 como en el padrón N° 425, persisten algunos equipos a la espera de su retiro, anexo a este informe se adjunta nota de solicitud de postergación del cierre de cantera, en virtud de una modificación de contrato que se esta tramitando actualmente.

Recuperación del Predio Obrador:

- Todas las instalaciones destinadas a oficinas pañoles, laboratorios, comedor y baños son móviles y fueron trasladados a distintos frentes de obra que la empresa tiene actualmente.
- Los residuos peligrosos, del tipo: filtros usados, trapos sucios, aceite usado, cubiertas, baterías, y suelo contaminado son gestionados para el cierre e la obra, mediante empresa autorizada para tal fin. Se presenta en ANEXO V los remitos de dicha gestión.
- Los residuos asimilables a domésticos son clasificados y gestionados mediante la recolección de residuos de la Intendencia de Salto.
- Las explanadas generadas para la implantación de los contenedores e instalaciones de bienestar, son conservadas a solicitud del propietario del predio. En ANEXO VI se presenta la nota de conformidad de los propietarios
- Todo material reutilizable como madera de encofrado, hierros, señales, tarrinas, caños de Hormigón o PVC, materiales granulares, etc son trasladados a los nuevos frentes de obra para su reutilización

Por IMPACTO CONSTRUCCIONES



Arq. Diego Biswanger
Adjunto a la Dirección de Obras
