



Expediente N° 2024-10-3-0004257

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0004257

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Informe

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA REG-G-74V01

Fecha iniciado: 03/09/2024 13:21:09

Fecha valor: 03/09/2024

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

**INFORME TRIMESTRAL GESTION
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

**INFORME TRIMESTRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL**

Proyecto	Licitación N° M/84: "Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio en Rutas 2, 12 y 23"
Contratante	CVU
Financiamiento	CVU

Fecha: 16/08/2024

Elaborado por: Ing. Ruben Vielma

Aprobado por: Ing. Paula Acosta

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS	3
2. QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024)	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	5
2.3. GESTIÓN DE CANTERAS	5
2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	8
MEDIDAS DE MITIGACIÓN	8
• CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9
• TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS	10
• MANTENIMIENTOS	10
• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS	11
• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS	11
• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS	11
2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	12
- Mediciones de emisiones Planta asfáltica	12
2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE	12
2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO	13
2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13
2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL	13
2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES	14
2.11. CONTINGENCIAS	14
3. ANEXO FOTOGRÁFICO	14
4. ANEXO 1	21

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA
REG-G-74 V01



1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01	16/08/2024	Todas	Elaboración del documento

2. QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre mayo, junio y julio 2024 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 28,17 % aproximadamente.

La obra cuenta con un obrador ubicado en el padrón N° 24448 de la 5ta sección catastral de Colonia, se accede al mismo por la ruta 12 km 132 y luego se transita por un camino vecinal. El obrador cuenta con oficinas, depósitos de productos químicos y combustibles, pañol, servicios higiénicos y duchas conectados a pozo impermeable, comedor, planta asfáltica, laboratorio y sitio de acopio de materiales clasificados por tipo y accesibles para su utilización y taller de mantenimiento.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°1: Ubicación del obrador.

En el presente trimestre en el frente de obra se ejecutaron las tareas de:

- Excavación de la capa vegetal, excavación del diente, recarga de subbase y base, refinado de la base ensanche n° 7
- Excavación de la capa vegetal, excavación del diente, recarga de subrasante, subbase y base del ensanche n° 9
- Excavación de la capa vegetal, excavación del diente, recarga de subrasante, y subbase del ensanche n° 10
- Colocación de 2^{da} capa base negra y carpeta de asfalto en ensanche n° 6
- Imprimación asfáltica en ensanche n° 7.
- Adecuación de niveles entre la faja y la banquina en Ruta 23.
- Sellado de fisuras de las rutas 2,12 y 23 (por puenteo y por área).
- Sellado por área Ruta 23.
- Trabajos de bacheo en ruta 2
- Limpieza y reparaciones de alcantarillas de ruta 2.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- Limpieza cuarto conos de Puente Arroyo Colla (ruta 2) y Puentes Arroyo Sauce (km167,5) y Arroyo Encierro (km 176) ruta 2
- Reparación de las juntas de dilatación del Puentes Arroyo Sauce (km167,5) y Arroyo Encierro (km 176) Ruta 2.
- Extracción de restos de tocones en ensanche nº 6, 7, 9, 10 y 11.
- Corte de pasto y recolección de residuos en faja pública ruta 2, 12 y 23
- Adecuación de la señalización vertical de ruta 2, 12 y 23
- Señalización horizontal y colocación de tachas en ensanches nº 6 de ruta 23
- Hormigón para cabezales de alcantarillas en ensanche nº 9, 10 y 11 el hormigón para alargues de alcantarillas es comprado a una planta de hormigón de CHOCA S.R.L ubicada en San Jose padrones 5403 y 5404, mismo sitio que las canteras comerciales del proveedor.
- Construcción de dos entradas particulares con caños de 500 mm en ruta 23
- Ejecución de 640 ton de bacheo parcial en calzada de ruta 23, por medio de las tareas extraordinarias de mantenimiento.

2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizaron actualizaciones respecto al PGA.

2.3. GESTIÓN DE CANTERAS

La obra requiere el uso de material granular, en el trimestre de referencia se continúa comprando tosca a la cantera comercial de CHOCA S.R.L pero en menor cantidad, en este trimestre no se utilizó piedra de RYFOR.

Canteras Comerciales	Ubicación	Proveedor	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)
Balasto CBR 60 y 80	Padrones 5403 y 5404 7ta sección catastral de San Jose	CANTERAS CHOCA S.R.L	2021/002199 R.M. 258/2022	18/03/2022

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



A continuación, el consumo de áridos del trimestre:

CONSUMO	Unidad	May-24	Jun-24	Jul-24
Arena	m3	0	0	0
Limo	-			
Piedra	m3	0	0	0
Polvo de cantera	m3	0	0	0
Portland	kg	4.325	1.350	5.375
Tosca cantera comercial CHOCA	m3	2.367	1.958	3.548
Tosca cantera Sierra de Mahoma P16683	m3	6.450	8.055	9.750
Tablas de encofrado	un	10	0	15
Tierra Vegetal	m3	0	0	0
Hormigón	m3	10,5	0	0

Las habilitaciones de las canteras comerciales ya fueron presentadas en el 1er ITGA. En cuanto a la arena en este trimestre no se utilizó.

Canteras Obra Pública:

Se cuenta con la AAP y AAO de Ministerio de ambiente para la cantera de obra pública ubicada en el mismo padrón del obrador (24448 de Colonia, se adjuntó en el 2do ITGA) la inclusión de Cantera de obra pública por parte del MTOP ya había sido presentada en el 1er ITGA.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°2: Ubicación Cantera padrón N° 24448 Colonia.

Se cuenta con otra cantera de obra pública de material granular ubicada en el padrón 16683 de San Jose (la habilitación de Ministerio de ambiente se adjuntó en el 3er ITGA) y la inclusión de obra pública se adjuntó en el 4to ITGA.

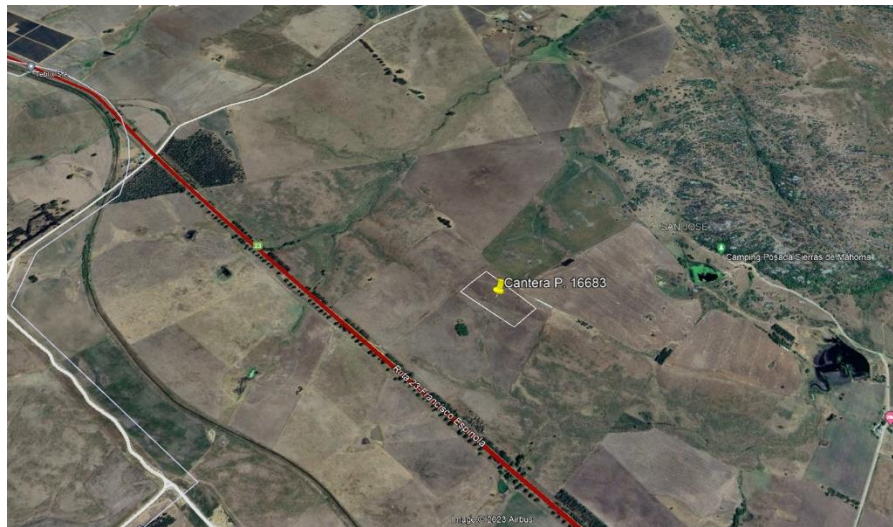


Imagen N°3: Ubicación Cantera padrón N° 16683 San Jose.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINACEA)	Fecha inicio de actividades	N° de resolución Obra Pública (MTO)	Fecha otorgada (Obra Pública)	Consumo del trimestre
Padrón 24448 Colonia	2023/36001/005284	29/08/2023	21/09/2023(se empezó con destape)	2023-10-3-0001972	14/07/2023	0
Padrón 16683 San Jose	2023/36001/012227	27/11/2023	18/01/2024	2023-10-3-0004649	08/02/2024	24255

Si bien se declaró el inicio de actividades en ambas canteras, solo se comenzó a extraer en febrero de la cantera del padrón 16683 de San Jose.

2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el ingreso a la misma.
- En el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan y son vaciados periódicamente por la empresa FICUZZ.
- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero de Cardona.
- Los residuos peligrosos generados son retirados por un móvil de AFRECOR para su disposición final.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se encuentra en funcionamiento la zona de taller mecánico para los mantenimientos de máquinas y camiones, con techo piso de hormigón y fosa.
- Se cuenta con bandejas antiderrames para los generadores de energía.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- La planta asfáltica cuenta con bandeja impermeable con piso y bloques de hormigón debajo de los tanques de combustible y asfalto.
- Los tanques de emulsión y MC1 cuentan con bandejas de contención.
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.
- El lavado de herramientas menores y el enjuague de la cuchara del mixer se lava en tanques de 200 lts, luego el agua es reutilizada en tareas de maquillaje. Los mixers pertenecen a la empresa CHOCA y vuelven a lavar a sus piletas. Los alargues de alcantarillas que se hicieron son de caños de hormigón solo se hormigona el cabezal.

- **CONSUMO DE COMBUSTIBLES**

Se presenta el consumo de combustibles, lubricantes y asfaltos del trimestre, en este no hubo consumos de asfaltos y derivados.

CONSUMO	Unidad	May-24	Jun-24	Jul-24
Aceites y Lubricantes	lts	570	347	416
Asfalto (Mezcla Asfáltica)	Ton			
Premezclado asfáltico	m3			
Emulsión MC1	lts			
Emulsión Riego 65	lts			
Emulsión Riego 65 - P25	kg			
Fueloíl	lts			
Gasoil Especial	lts	342	700	1.930
Gasoil	lts	38.582	30.835	55.858
Kerosén	lts	0	0	0
Nafta	lts	2.489	2.238	2.641
Percloroetileno	lts	5	5	0
Supergas	kg	0	0	39

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



• TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS

La empresa que realiza la limpieza de los baños químicos es FICUZZ se adjuntan los remitos al final.

RESIDUOS	Unidad	May-24	Jun-24	Jul-24
Limpieza baños químicos	Its	160	160	160

• MANTENIMIENTOS

Los mantenimientos son realizados en el obrador de la empresa, se presenta planilla de los mantenimientos realizados.

No se realiza lavado de de maquinaria/vehículos que se generen efluente resultante (grasas y aceites).

SEMANA	FECHA	OBRA	DEPARTAMENTO / LOCALIDAD	MAQUINA/VEHICULO	CHOFER	FILTROS	LIQUIDOS	FRECUENCIA SERVICE	REALIZA	ESTADO
Semana 19	08/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	C2-043	David Diaz	Retirar en porteria Apolon	27,5Its 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 19	08/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	CT-094	Ruben Vielma	Lleva Milton Bertazzi	7,5Its 15w40	10.000 kilometros	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 21	23/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	EX-028	Victor Tecco	Se envian a Cardona por DAC	25Its 15w40 - 12Its SAE50 - 8Its SAE30	PM3	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 21	23/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	EX-040	Ronaldo Alvez	Se envian a Cardona por DAC	20Its 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 21	23/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	FR-004	Juan Rusconi	Se envian a Cardona por DAC	47Its 15w40 - 20Its ISO VG220 - 10Its 80w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 21	23/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	GE-190		Se envian a Cardona por DAC	35Its 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 21	23/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	MO-016	Martin Bordenave	Se envian a Cardona por DAC	25Its 15w40 - 65Its SAE30 - 128,5Its SAE50 - 7Its 80w90	PM4	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 22	29/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	BR-004		Retirar en porteria Apolon	5Its 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 22	29/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	RE-031	Luis Olivera	Retirar en Porteria Apolon	14Its 15w40	330 - 660 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 22	30/05/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Trinidad	C1-042	Ricardo Casaella	Service oficial		10.000 kilometros	Taller Moreira Motors	Realizado
Semana 25	18/06/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	CM-020	Claudio Viettro	Se envian a Cardona por DAC	12Its 15w40	330 horas	Taller movil 2	Realizado
Semana 25	19/06/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	CT-094	Ruben Vielma	Retirar en Porteria	7,5Its 5w30	10.000 kilometros	Taller movil 2	Realizado
Semana 25	20/06/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	RE-040	Franco Borrea	Retirar en Porteria Apolon	14Its 15w40	330 - 660 horas	Taller movil 2	Realizado
Semana 26	27/06/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	C2-048	Rudy Gomez	Filtros de aire a Cardona por DAC - El resto para retirar en porteria Apolon	26Its 15w40	20.000 kilometros	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 26	27/06/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	CM-025	Oscar Martinez	Se envia a Cardona por DAC	10Its 15w40 - 5,5Its ISO 220 sintetico - 17Its SAE30	PM3	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 26	27/06/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	PC-017	Alfredo Olivera	Se envian a Cardona por DAC	18Its 15w40 - 43Its 80w90 - 45Its SAE30	PM3	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 27	04/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	C2-043	David Diaz	Retirar en porteria Apolon	27,5Its 15w40 - 50Its 80w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 27	04/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	CM-032	Walter Barrios	Retirar en porteria Apolon. Filtros de aire a Cardona por DAC	20Its 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 27	04/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	EX-035	Elcar Piriz	Se envian a Cardona por DAC	25Its 15w40 - 10Its SAE30 - 11Its SAE50	PM4	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 29	16/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	C3-021	Franco Olivera	Retirar en porteria Apolon	36Its 15w40	10.000 kilometros	Taller movil 2	Realizado
semana 30	24/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	C1-043		Se envian a Cardona por DAC	10Its 15w40	10.000 kilometros	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 30	24/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	PV-003		Se envian a Cardona por DAC	22Its 15w40 - 17Its 75w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1	Realizado
Semana 30	25/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	C3-020	Rolando Ocampo		35Its 15w40	10.000 kilometros	Taller movil 1	Realizado
Semana 30	25/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	EX-028	Victor Tecco	Se envian a Cardona por DAC	25Its 15w40	PM2	Taller movil 2	Realizado
Semana 30	26/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	CM-038	Federico Casco	Corporacion de Maquinaria	Corporacion de Maquinaria	250 horas	Corporacion de maquinaria	Realizado
semana 31	31/07/2024	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	Cardona	CM-041	Felipe Moreno	Corporacion de Maquinaria	Corporacion de Maquinaria	250 horas	Corporacion de maquinaria	Realizado

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS

FECHA	TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD	MEDIDA	DESTINO
28/5/2024	PAPEL Y CARTÓN, PLÁSTICOS Y DOMÉSTICOS	6	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
7/6/2024	PAPEL Y CARTÓN, PLÁSTICOS Y DOMÉSTICOS	4	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
17/6/2024	RESIDUOS DOMÉSTICOS	2	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
19/6/2024	PLASTICOS Y DOMÉSTICOS	3	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
19/6/2024	PAPEL Y CARTÓN, PLÁSTICOS, NEUMÁTICOS Y DOMÉSTICOS	4	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
20/6/2024	PLÁSTICOS.	2	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
5/7/2024	PLASTICOS Y DOMÉSTICOS	3	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
24/7/2024	PAPEL Y CARTÓN, DOMÉSTICOS	3	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA

• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

La gestión de residuos peligrosos fue realizada por un camión móvil de AFRECOR, el 14/06/2024 con el remito 15180 y el 26/07/2024 con el remito 14972, a continuación, se presenta una tabla resumen.

FECHA	Origen	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANTIDAD	GESTOR	NRO REMITO GESTOR
14/6/2024	O4701 M84	Aceite usado	Lts	800	AFRECOR	15180
14/6/2024	O4701 M84	Baterías usadas	uni	4	AFRECOR	15180
14/6/2024	O4701 M84	Trapos sucios de mantenimiento	Lts	200	AFRECOR	15180
14/6/2024	O4701 M84	Percloroetileno	Lts	27	AFRECOR	15180
14/6/2024	O4701 M84	Filtro de aceite usado	Lts	200	AFRECOR	15180
26/7/2024	O4701 M84	Aceite usado	Lts	400	AFRECOR	14972
26/7/2024	O4701 M84	Filtro de aceite usado	Lts	200	AFRECOR	14972
26/7/2024	O4701 M84	Trapos sucios de mantenimiento	Lts	200	AFRECOR	14972
26/7/2024	O4701 M84	Baterías usadas	uni	1	AFRECOR	14972
26/7/2024	O4701 M84	Percloroetileno	Lts	20	AFRECOR	14972

• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

SERVICIO	INSUMO
Barométrica	barométrica Municipal Ismael Cortinas (pozo)
Baños químicos	FICUZZ (limpieza baños químicos)
SP Seguridad	Seguridad (Serenos)
PROVEEDOR	INSUMO
HORMIGON CHOCA	HORMIGON
CANTERAS CHOCA	TOSCA
BITAFAL	BITAFLEX SA40, RIEGO R65
ANCAP	ASFALTO AC30, MC1, FUEL OIL

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA
REG-G-74 V01



ESTACION ANCAP (Cardona)	COMBUSTIBLES
TECNOLAVADOS	ECOPLUS, ASFALTEC PLUS
RELETRA	AGUA POTABLE
Dubarco	BALIZAS
Enzo Repuestos	REPUESTOS
Tornería Barboza	PIEZAS MECANISA Y REPUESTOS
Gustavo Sotto	BARRACA FERRERIA
EL CHAMBON	GOMERIA
DROGUERIA INDUSTRIAL URUGUAYA	PERCLOROETILENO

2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

- **Mediciones de emisiones Planta asfáltica**

La última medición de la planta asfáltica se realizó el 17/10/2023 (adjunto en el 2do ITGA).

2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



CODIGO	VEHICULO	CODIGO	VEHICULO
BR 002	BARREDORA	C6-007	CAMIÓN REGADOR DE AGUA
BR-004	BARREDORA	C6-010	CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO
C1-025	CAMIÓN MECÁNICO	CM-020	COMPACTADOR PATA DE CABRA
C1-029		CM 023	
C1 033		CM-025	
C1-042	CAMION CON VOLCADORA	CM-032	
C1-043		CM 034	
C2 006		CM-035	
C2-025	CAMIÓN REGADOR DE AGUA	CM-038	
C2 043	CAMION CON VOLCADORA	CM-041	
C2-044	CAMION CON VOLCADORA	EX-028	EXCAVADORA
C2-045	CAMION CON VOLCADORA	EX-035	EXCAVADORA
C2-046	CAMION CON VOLCADORA	EX-040	EXCAVADORA
C2-047	CAMION CON VOLCADORA	FR-001	FRESADORA
C2-048	CAMION CON VOLCADORA	FR-004	FRESADORA BOMAG
C2-049	CAMION CON VOLCADORA	MO-016	
C2 050	CAMION CON VOLCADORA	PC-017	PALA
C2-056	CAMION CON VOLCADORA	PLA-002	PLANTA DE ASFALTO
C2-062	CAMION CON VOLCADORA	PV-002	PAVIMENTADORA ASFALTO
C2-067	CAMION CON VOLCADORA	PV-003	PAVIMENTADORA ASFALTO
C2-068	CAMION CON VOLCADORA	PV 004	PAVIMENTADORA ASFALTO
C2-069	CAMION CON VOLCADORA	RE-031	RETROEXCAVADORA
C2-078	CAMION CON VOLCADORA	RE-040	RETROEXCAVADORA
C2-081	CAMION CON VOLCADORA	SE-001	SELLADORA DE ASFALTO
C2-087	CAMION CON VOLCADORA	SE-002	SELLADORA DE ASFALTO
C2-088	CAMION CON VOLCADORA	GE-190	GENERADOR
C2-093	CAMION CON VOLCADORA	CMA-001	COMPACTADOR CHICO
C6-006	CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO		

2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 56 personas.

2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron capacitaciones en el trimestre.

2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se realizaron interacciones con la comunidad local, no hubo quejas o reclamos.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES

En el trimestre de referencia el 21/06/2024 se tuvo una auditoría ambiental de seguimiento (fin de obras obligatorias), se recibió el Informe de auditoría FSG-AUA-03A (Inf. de AA-Obra M84) - 20240621 - V2, en el cual no se presentan no conformidades ni observaciones, se adjunta al final.

2.11. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias.

3. ANEXO FOTOGRÁFICO

Se presentan imágenes del obrador y de los frentes de obra para el trimestre de referencia.



INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°4 y 5: Frente de cantera P.16683 de San Jose.



Imagen N°6: Kit de derrame en instalaciones de la cantera P.16683 de San Jose.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°7: Recipientes para residuos obrador.



Imagen N°8: Instalaciones del taller mecánico en obrador.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°9: Mantenimiento de alcantarillas obstruidas.



Imagen N°10: Ejecución de subbase ensanche 9.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°11: Tendido y compactación de subrasante.

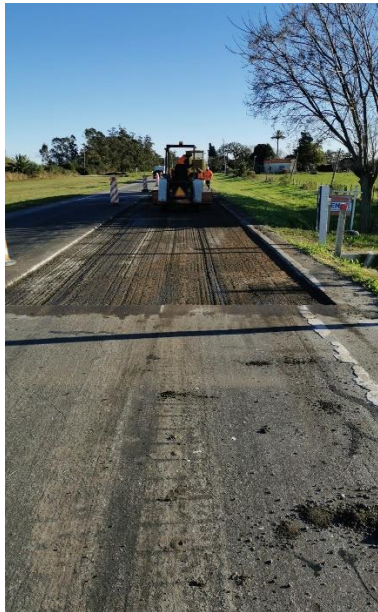


Imagen N°12: Bacheo en ruta 23.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°13 y 14: Tendido y compactación de subbase.



Imagen N°15: Pintura ensanche de carril 6.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°16: Reparación de puentes A° Sauce y A° Encierro.

**INFORME TRIMESTRAL GESTION
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



4. ANEXO 1

Se adjuntan:

- Informe de auditoría ambiental FSG-AUA-03A (Inf. de AA-Obra M84) - 20240621 - V2 del 21/06/2024
- Remitos residuos peligrosos AFRECOR 15180 y 14972
- Adhesión de subcontrato Bordonix al PGA de la obra
- Registros de entrega de materiales usados (residuos asimilables a domésticos)
- Remitos de limpieza de baños FICUZZ



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra

M/84 – Contrato 31/01/2023

Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23”

Empresa constructora: José Cujó SA

Fecha auditoria: 21/06/2024



Fecha informe: 08/07/2024

Tipo de auditoría Seguimiento

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Ing. Martín Salgueiro	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	

FSG AUA 03A

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz



	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

Índice

1	Alcance	6
2	Criterios de Auditoría Ambiental	6
3	Contrapartes y Observadores.....	7
4	La Obra	7
4.1	Descripción general de la obra	7
4.2	Estado de avance de la obra	8
5	Tareas realizadas.....	9
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores (12/12/2023)	10
7	Hallazgos de auditoría.....	11
7.1	Constataciones	11
7.2	No Conformidades	13
7.3	Observaciones	13
8	Fortalezas	14
9	Oportunidades de Mejora	14
10	Confidencialidad del contenido.....	14
11	Lista de Distribución	14
12	Anexo I - Registro Fotográfico	15
12.1	Obrador, planta asfáltica y cantera de Obra Pública.....	15
12.2	Frentes en obra y obras obligatorias terminadas.	17
12.3	Fotografías proporcionadas por la empresa el 06/02/2024.	20

Índice de figuras

Figura 4-1	Ubicación de la obra.	8
Figura 5-1	Lugares de interés.	9

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

Índice de fotos

Foto 12.1-1, P03. Obrador y planta asfáltica de José Cujó S.A. Padrón 24448 de la 5ª SC de Colonia. Vista general.....	15
Foto 12.1-2, P03. Obrador, estación de acopio transitorio de residuos segregados por corriente de generación.....	15
Foto 12.1-3, P03. Obrador, depósito impermeable para aguas servidas.....	15
Foto 12.1-4, P03. Obrador, laboratorio de suelos y asfaltos en buenas condiciones de orden y limpieza.....	15
Foto 12.1-5, P03. Obrador laboratorio con efluentes líquidos contaminantes correctamente acopiados.	16
Foto 12.1-6, P03. Obrador sector techado para almacenaje de cubiertas.....	16
Foto 12.1-7, P03. Obrador, sector envallado para acopio de aceites usados y residuos contaminados con hidrocarburos.	16
Foto 12.1-8, P03. Planta asfáltica, envallados adecuados para contención de derrames y buenas condiciones de orden y limpieza.....	16
Foto 12.1-9, P04. Cantera de tosca. Padrón N°16683 de la 4ª S.C.I de San José. Ruta 23, progresiva 126K600 a (+).	16
Foto 12.1-10, P04. Cantera de tosca, frente de ataque.....	16
Foto 12.1-11, P04. Pañol y campamento provisorio con servicios de bienestar adecuados.	17
Foto 12.1-12, P04. Estación de acopio temporal de residuos en buenas condiciones, para segregación por corriente de generación.	17
Foto 12.2-1, P01. Inicio de obra, Ruta 23, progresiva 100K000, empalme con Ruta 11.....	17
Foto 12.2-2, P01. Inicio de obra, Ruta 23, progresiva 100K000, empalme con Ruta 11.....	17
Foto 12.2-3, P05. Empalme con camino municipal terminado. Ruta 23, progresiva 118K600 a (+).....	18
Foto 12.2-4, P05. Altimetría corregida y empalme rectificado.	18
Foto 12.2-5, P05. Campamento provisorio desmantelado y restituido a su propietario. No hay restos de ROCs u otros residuos.	18
Foto 12.2-6. Sector de Ruta 23, con terceras vías abiertas al tránsito con carpeta asfáltica terminada, senda a (+).....	18
Foto 12.2-7. Sector de Ruta 23, con terceras vías abiertas al tránsito con carpeta asfáltica terminada, senda a (-).....	19



	<p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>		<p>M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024</p>
<p>Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.</p>				
<p>Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill</p>		<p>Fecha Informe: 08-07-2024</p>		

Foto 12.2-8, P06. Frente de obras, ejecución de terceros carriles, Ruta 23, progresiva 139K000 a (-)..... 19

Foto 12.2-9, P06. Ensanche y compactación de base granular para terceros carriles en ejecución. 19

Foto 12.2-10, P06. Movimiento de suelos y apertura de caja en subrasante para ensanche de terceros carriles en ejecución. 19

Foto 12.2-11. Obras obligatorias terminadas de Ruta 23 en planta urbana de Ismael Cortinas, obras de señalización culminadas. 19

Foto 12.2-12, P02. Fin de obras en Ruta 23, progresiva 152K200, acceso Este a Ismael Cortinas. 19

Foto 12.3-1, progresiva 121K700 a (-). La empresa retiró el suelo contaminado con derrame de emulsión asfáltica y le dio disposición final como residuo peligroso..... 20

Foto 12.3-2, P05. Campamento provisorio con infraestructura adecuada para acopio temporal de residuos. 20

Foto 12.3-3, P03. La empresa ejecutó una nueva explanada envallada impermeable para el depósito de emulsiones asfálticas..... 20

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 36/2022, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITGA, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

Tipo 1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento de compromisos legales y/o reglamentarios

Tipo 2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

Tipo 3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores.

- c. El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
- d. El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

2 Criterios de Auditoría Ambiental

- Manual ambiental vial de DNV de 2015.
- Requisitos legales y reglamentarios.

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en las oficinas como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

- Contrato de obra del 31/01/2023 entre Corporación Vial del Uruguay SA – CVU y José Cujó SA, con plazo de obra de 48 meses.
- PGA v02 de la empresa José Cujó SA del 23/05/2023,
- ITGA de la empresa José Cujó SA del período Mayo 2023 – Abril 2024.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
 - i. Dirección de obra DNV – MTOP: Ing. Myriam Grill
 - ii. Asistente del DEGAC de DNV – MTOP: Ing. Sarah Morioka
- b) Por parte de la empresa contratista:
 - i. Residente de José Cujó SA: Ing. Rubén Vielma.
 - ii. Técnico Ambiental de José Cujó SA: Ing. Paula Acosta.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

Según el PGA del contrato, la obra comprende la rehabilitación y mantenimiento de rutas 2, 12 y 23. Para ello, el proyecto prevé realizar obras tales como alargues de alcantarillas, ensanche de plataforma para construir terceras sendas y dársenas, construcción de bases granulares, estabilización con cemento portland, ejecución de tratamiento bituminoso doble, ejecución de carpeta asfáltica y obras de señalización vertical y horizontal.





	<p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>		<p>M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024</p>
<p>Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.</p>				
<p>Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill</p>			<p>Fecha Informe: 08-07-2024</p>	



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: 02/05/2023, firma del Acta de Replanteo.
- b. Fecha estimada de finalización: Abril 2027; las obras obligatorias están culminadas.
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: Avance estimado 25%.
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: movimiento de suelos, ensanche de plataforma, recargo granular, construcción de terceros carriles y dársenas.

	<p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>		<p>M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024</p>
<p>Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.</p>				
<p>Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill</p>			<p>Fecha Informe: 08-07-2024</p>	

5 Tareas realizadas

Durante la auditoría ambiental se recorrió íntegramente el tramo del contrato en Ruta 23 entre las progresivas 100K000 y 152K200, el obrador y la planta asfáltica de José Cujó SA, el frente de obras y la cantera de obra Pública en Ruta 23 progresivas 118K600 y 126K600 respectivamente.

La recorrida incluyó las obras obligatorias terminadas, en el tramo urbano de Ruta 23 en la localidad de Ismael Cortinas y en P05 donde se corrigió el empalme con el camino municipal existente y la altimetría local de ese tramo de Ruta 23.

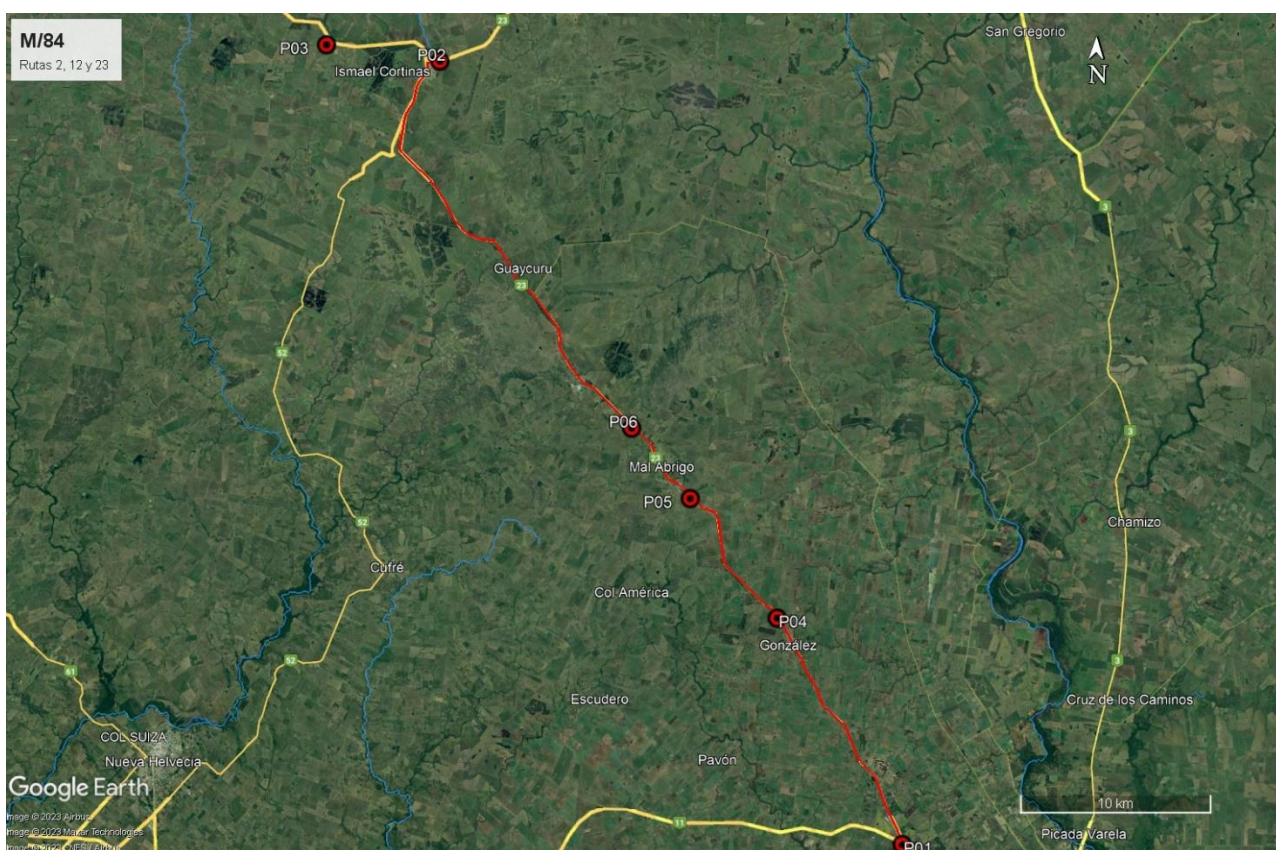



Figura 5-1 Lugares de interés.


 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84
			Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.			
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill		Fecha Informe: 08-07-2024	

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	517489	6202349	Inicio de obras en Ruta 23, progresiva 100K000, empalme con Ruta 11, acceso Oeste a Juan Soler.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.2-1, Foto 12.2-2.
P02	492258	6242443	Fin de obras en Ruta 23, progresiva 152K200, Acceso Este a Ismael Cortinas.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.2-12.
P03	486296	6243142	Obrador y planta asfáltica de José Cujó S.A. Padrón 24448 de la 5ª. SC de Colonia.	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-1, Foto 12.1-2, Foto 12.1-3, Foto 12.1-4, Foto 12.1-5, Foto 12.1-6, Foto 12.1-7, Foto 12.1-8, Foto 12.3-3.
P04	505974	6219992	Cantera de tosca. Padrón N°16683 de la 4ª Sección Catastral de San José. Ruta 23, progresiva 126K600 a (+).	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.1-9, Foto 12.1-10, Foto 12.1-11, Foto 12.1-12.
P05	510675	6213909	Empalme con camino municipal terminado y Campamento provisorio desmontado en Ruta 23, progresiva 118K600 a (+)	Figura 4-1, Figura 5-1, Foto 12.2-3, Foto 12.2-4, Foto 12.2-5, Foto 12.3-2.
P06	495590	6232661	Frente de obras, ejecución de terceros carriles, Ruta 23, progresiva 139K000 a (-).	Figura 5-1, Foto 12.2-8, Foto 12.2-9, Foto 12.2-10.

Tabla 1 - Descripción de los lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores (12/12/2023)

Ref.	Descripción	Requisito
01	El estacionamiento de maquinaria – P05 – ubicado en faja pública de Ruta 23, progresiva 121K700 a (-) no cuenta con la infraestructura propia de un campamento provisorio. Existe un derrame de emulsión asfáltica sobre suelo desnudo que no puede ser removido por falta de los implementos previstos en el PGA. Tampoco hay evidencia de aprobación de DNV – MTOP para el uso de la faja pública de Ruta 23 al servicio de la obra.	Dec 182/013. Apartado 2.2.2 del PGA. Apartados 6.3 y 6.5 del MAV 2015
	Situación actual: cumplido	
	Evidencia: El suelo contaminado fue retirado y dispuesto según el PGA. Foto 12.3-1.	
02	El campamento provisorio – P04 – ubicado en faja pública de, Ruta 23, progresiva 118K600 a (+) no cuenta con la infraestructura para la gestión de residuos de forma segregada. Tampoco hay evidencia de aprobación de DNV – MTOP para el uso de la faja pública de Ruta 23 al servicio de la obra.	Dec 182/013. Apartado 2.2.2 del PGA. Apartados 6.3 y 6.5 del MAV 2015
	Situación actual: cumplido	

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.			
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill		Fecha Informe: 08-07-2024	

	Evidencia: La empresa remitió la nota de DDO con la autorización faltante e instaló la infraestructura para acopio temporal de residuos. Al culminar las obras obligatorias, desmontó ese campamento provisorio. Foto 12.3-2
--	---

Ref.	Descripción	Requisito
03	El obrador – P03 – cuenta con buena infraestructura para gestión de residuos de forma segregada, no obstante, algunos residuos están incorrectamente acopiados, fuera de los sectores predefinidos.	Apartado 2.2.2 del PGA
	Situación actual: cumplido	
	Evidencia: Foto 12.1-2, Foto 12.1-7	

Ref.	Descripción	Requisito
04	El envallado impermeable donde se ubican los tanques de emulsión no son capaces de contener el 110% del volumen almacenado.	Apartado 6.2 del MAV 2015
	Situación actual: cumplido	
	Evidencia: Foto 12.3-3	

7 Hallazgos de auditoría

7.1 Constataciones

Al momento de la auditoría, han sido culminadas las obras obligatorias del contrato, consistentes en el tramo urbano de la Ruta en la localidad de Ismael Cortinas y en la corrección altimétrica del empalme de un camino departamental de San Jose con la Ruta 23 – P05. Por su parte, se encontraron en ejecución la construcción de terceras vías en varios sectores de la ruta.

La empresa José Cujó SA ejecuta el contrato desde un obrador ubicado en el padrón urbano 24448 de la 5ª Sección Catastral de Colonia contando para ello con autorización de DNV-MTOP del 11/06/2023. En ese predio también está ubicada la planta asfáltica de la obra.

El obrador cuenta con estructuras desmontables adaptadas para oficinas, servicios higiénicos y duchas, vestuarios, comedor, laboratorio de suelos y asfaltos. Cuenta además con explanadas granulares donde se ubican el taller de herrería, la playa de maniobras y estacionamientos y los acopios de áridos.

En general, al momento de la recorrida al obrador se pudo comprobar que las condiciones de orden y limpieza generales eran adecuadas. Dicho obrador cuenta con sectores envallados para el acopio de tarrinas de lubricantes, combustibles y tanques de emulsión. La planta asfáltica se encontró ordenada, libre de derrames y con buenas condiciones de limpieza.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

Los ITGA presentados por la empresa dan cuenta de que la gestión de residuos se realiza de forma segregada, según se trate o no de residuos comprendidos en la Cat 1 del Dec 182/013. En ellos hay evidencia de que los residuos asimilables a domésticos tienen su disposición final en la red municipal de Ismael Cortinas, mientras que residuos reciclables como nylon y cartón son retirados por la Cooperativa COREFLO.

Respecto de la gestión de los residuos contaminantes, los ITGA adjuntan comprobantes de la gestión y disposición final para cada corriente de residuos por separado. Los neumáticos usados son gestionados por medio del plan maestro Reciclo NFU. Los aceites usados y los residuos contaminados tales como filtros de aceite, percloroetileno usado, baterías usadas son gestionados por Afrecor SA. El servicio de desagote del depósito impermeable del campamento provisorio lo brinda barométrica Ficuzz SRL.

Respecto de las emisiones a la atmósfera de esa planta asfáltica, DEGAC – DNV y CVU indicaron el 24/01/2024 al Equipo Auditor y con carácter general, luego de un acuerdo entre DINACEA y DNV, considerar los valores de emisiones sin la corrección del oxígeno al 7% indicada en el apartado 28 del Dec 135/021 de Reglamento de Calidad del Aire. Al respecto, la empresa remitió un informe del Laboratorio Ecotech del 27/10/2023, donde los valores medidos sin corrección del oxígeno, están por debajo de los topes establecidos por el mencionado decreto.

También se presenta un análisis de emisiones de ruido medidos en el alambrado separativo con el predio lindero al obrador. De ese análisis se puede deducir que los valores de ruido en la vivienda existente en el predio lindero estarán por debajo del tope admisible de 50 dB, considerando la distancia de la vivienda al alambrado.

La empresa utiliza áridos – piedra, balasto y tosca – para la ejecución de las, bases granulares y la mezcla asfáltica, recurriendo para ello a una cantera de Obra Pública y canteras comerciales.

Según el Exp. 2020/14000/4832 de DINAMA del 21 de julio de 2020, la cantera con explotación concedida a Ryfor SA, ubicada en el padrón N°4628 de la 2ª Sección Catastral de Flores, obtuvo la AAP y AAO (Autorización Ambiental Previa y de Operación) para la extracción de piedra partida, por 3 años. El inicio de actividades de dicha cantera fue el 29/07/2021, momento en que la Dirección nacional de Minería y Geología – DINAMIGE del Ministerio de Industria, Energía y Minería – MIEM, otorgó a la empresa el título minero concesión para explotar. De tal modo, la AAO está próxima a su vencimiento. Se retoma este comentario en el apartado 9.

Por su parte, según el Exp. 2021/36001/2199 de Ministerio de Ambiente del 18/03/2022, la cantera con explotación concedida a Canteras Choca SRL, ubicada en los padrones N°5043 y 5044 de la

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

7ª Sección Catastral de San José, obtuvo la renovación de la AAO para la extracción de un estimado de 80.000 m³ de tosca y balasto en un área de explotación de 6 há., por un plazo de 3 años.

Respecto de la arena para las obras de hormigón, según el Exp. 2016/1/2/5014 de la Dirección Nacional de Hidrografía, se concedió a Arenera Virruarena SA el derecho de extracción de la arena procedente del álveo público del Río Negro, entre progresivas 58K y 75K de la 4ª Sección Catastral del Departamento de Soriano, por el trimestre Enero - Marzo 2024.

Por último, según el Exp. 2023/36001/12227 del Ministerio de Ambiente del 27/11/2023, la cantera de Obra Pública con explotación concedida a José Cujó SA, ubicada en el padrón N°16683 de la 4ª Sección Catastral de San José, obtuvo la AAP y AAO para la extracción de hasta 50.000 m³ de tosca y balasto, por un plazo de 3 años.

Al momento de la auditoría, había un frente de obras activo en Ruta 23 progresiva 139K000 a (-) – P06 –, donde se estaban realizando tareas de movimiento de suelos y recargo granular para la construcción de terceras vías. En esa zona, se pudo comprobar que los trabajos se estaban ejecutando de buena forma, apegada al PGA del contrato.

Se pudo comprobar también que las obras obligatorias del contrato están ejecutadas. Uno de ellos en el tramo urbano de Ismael Cortinas coincidente con el punto final del tramo P02, donde la nueva carpeta de rodadura fue terminada y cuenta con señalización definitiva.

Asimismo, en P04 la obra obligatoria de la rectificación planimétrica y altimétrica del empalme con el camino municipal existente también se encuentra culminada. En ese punto, el campamento provisorio fue desmontado y se restituyó el sector del predio libre de ROCs u otros residuos a su propietario, quien ya lo ocupó para su actividad original - Foto 12.2-5.

Desde el punto de vista de del usuario de la red vial, al momento de la auditoría ambiental el tránsito por la zona se realiza en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez. Las obras no suponen grandes dificultades al tránsito existente, y la señalización de obra es correcta.

7.2 No Conformidades

No se detectaron.

7.3 Observaciones

No se realizan.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

8 Fortalezas

Se identificó buena disposición de las empresas y de DNV – MTOP para atender los requerimientos de la auditoría ambiental. La información ambiental proporcionada por la empresa José Cujó SA es completa y adecuada a los fines de la auditoría.

9 Oportunidades de Mejora

Para los próximos ingresos de empresas subcontratistas para la ejecución de tareas de mantenimiento – corte de pasto, limpieza de cunetas, etc. –, se sugiere que la empresa realice instancias de capacitación en cuanto a la gestión ambiental requerida por el MAV 2015 y el PGA de la obra.

Asimismo, en virtud de que la cantera comercial Ryfor SA tiene sus permisos ambientales próximos a vencer, se sugiere previo a la realización de nuevas adquisiciones de áridos que se corrobore con la cantera la renovación de la AAO o bien que se evalúe la sustitución del proveedor.

10 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

11 Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).
- c. Copia para Corporación Vial del Uruguay (CVU).

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

12 Anexo I - Registro Fotográfico

12.1 Obrador, planta asfáltica y cantera de Obra Pública



Foto 12.1-1, P03. Obrador y planta asfáltica de José Cujó S.A. Padrón 24448 de la 5ª SC de Colonia. Vista general.



Foto 12.1-2, P03. Obrador, estación de acopio transitorio de residuos segregados por corriente de generación.



Foto 12.1-3, P03. Obrador, depósito impermeable para aguas servidas.



Foto 12.1-4, P03. Obrador, laboratorio de suelos y asfaltos en buenas condiciones de orden y limpieza.



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/84
Fecha Auditoría:
21/06/2024

Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.

Empresa Constructora: José Cujó SA.
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 08-07-2024



Foto 12.1-5, P03. Obrador laboratorio con efluentes líquidos contaminantes correctamente acopiados.



Foto 12.1-6, P03. Obrador sector techado para almacenaje de cubiertas.



Foto 12.1-7, P03. Obrador, sector envallado para acopio de aceites usados y residuos contaminados con hidrocarburos.



Foto 12.1-8, P03. Planta asfáltica, envallados adecuados para contención de derrames y buenas condiciones de orden y limpieza



Foto 12.1-9, P04. Cantera de tosca. Padrón N°16683 de la 4ª S.C.I de San José. Ruta 23, progresiva 126K600 a (+).



Foto 12.1-10, P04. Cantera de tosca, frente de ataque.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	



Foto 12.1-11, P04. Pañol y campamento provisorio con servicios de bienestar adecuados.



Foto 12.1-12, P04. Estación de acopio temporal de residuos en buenas condiciones, para segregación por corriente de generación.

12.2 Frentes en obra y obras obligatorias terminadas.



Foto 12.2-1, P01. Inicio de obra, Ruta 23, progresiva 100K000, empalme con Ruta 11.



Foto 12.2-2, P01. Inicio de obra, Ruta 23, progresiva 100K000, empalme con Ruta 11.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	



Foto 12.2-3, P05. Empalme con camino municipal terminado. Ruta 23, progresiva 118K600 a (+).



Foto 12.2-4, P05. Altimetría corregida y empalme rectificado.



Foto 12.2-5, P05. Campamento provisorio desmantelado y restituido a su propietario. No hay restos de ROCs u otros residuos.



Foto 12.2-6. Sector de Ruta 23, con terceras vías abiertas al tránsito con carpeta asfáltica terminada, senda a (+).



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL



M/84
Fecha Auditoría:
21/06/2024

Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.

Empresa Constructora: José Cujó SA.
Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill

Fecha Informe: 08-07-2024



Foto 12.2-7. Sector de Ruta 23, con terceras vías abiertas al tránsito con carpeta asfáltica terminada, senda a (-).



Foto 12.2-8, P06. Frente de obras, ejecución de terceros carriles, Ruta 23, progresiva 139K000 a (-)



Foto 12.2-9, P06. Ensanche y compactación de base granular para terceros carriles en ejecución.





Foto 12.2-10, P06. Movimiento de suelos y apertura de caja en subrasante para ensanche de terceros carriles en ejecución.



Foto 12.2-11. Obras obligatorias terminadas de Ruta 23 en planta urbana de Ismael Cortinas, obras de señalización culminadas.



Foto 12.2-12, P02. Fin de obras en Ruta 23, progresiva 152K200, acceso Este a Ismael Cortinas.

	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL		M/84 Fecha Auditoría: 21/06/2024
Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23.				
Empresa Constructora: José Cujó SA. Director de Obra - DNV: Ing. Myriam Grill			Fecha Informe: 08-07-2024	

12.3 Fotografías proporcionadas por la empresa el 06/02/2024.



Foto 12.3-1, progresiva 121K700 a (-). La empresa retiró el suelo contaminado con derrame de emulsión asfáltica y le dio disposición final como residuo peligroso.



Foto 12.3-2, P05. Campamento provisorio con infraestructura adecuada para acopio temporal de residuos.



Foto 12.3-3, P03. La empresa ejecutó una nueva explanada envallada impermeable para el depósito de emulsiones asfálticas.



Por medio de la presente declaro, en nombre de la empresa Bordonix S.A. subcontrato de JOSÉ CUJÓ SA en la obra M84:

1. Haber recibido el Plan de Gestión Ambiental de la obra M84.
2. Haber recibido el Programa de monitoreo ambiental REG O 43 de la obra.
3. Haber comprendido los contenidos de la documentación que me ha sido entregada aceptando los términos de dichos documentos y comprometiéndome a cumplir sus contenidos como requisitos mínimos.
4. Que la empresa por la que firmo manifiesta ser conocedora de sus obligaciones en materia ambiental, habiendo tomado las medidas oportunas para satisfacerlas.
5. Brindar a todos los trabajadores la adecuada información y formación sobre los impactos ambientales de su actividad

Sin otro particular saluda atentamente,

Por Bordonix S.A.

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



N° 15180

Haiti 1500; PTI Cerro

Tel.: 2311 9915

www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	14/6/2024
---------------------	-----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
AGU	4	TAMPONES
DATEBIN	4	UL
TRABO CONTAMINADO	1	TARINA
PERCOLESTRENO	3	UL
FILTROS	1	TAMPON

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	JOSE COJO OBRADOR BUENAS RASAS 133		
LUGAR DE RETIRO:	BUENA RASAS RM 133		
LOCALIDAD:	ISMAELCORTINA	DEPARTAMENTO:	COLOMIA
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			
DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019			
Responsable por AFRECOR S.A.		Responsable Generador / Cliente	

IMP. GONZALO PEREYRA - DEL 014.601 AL 015.600 X 2 - 05/2024

1 VIA BLANCA CLIENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



N° 14972

Haiti 1500; PTI Cerro
 Tel.: 2311 9915
 www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	26/7/2024
---------------------	-----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
ALU	2	TAMBORES
FILTRO	1	TAMBOR
TRABO CONTAMINADO	1	TAMBOR
PALETA	2	UU
PERCORETIBENO	20	LT

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	JOSE CUSO M84		
LUGAR DE RETIRO:	BUTA 12		
LOCALIDAD:	WASMAELCORONA	DEPARTAMENTO:	COLONIA
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			
DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019			
 Responsable por AFRECOR S.A.		 Responsable Generador / Cliente	

Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, OS de Julio de 2024.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	1m ³
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros: residuos domésticos	2m ³

TOTAL 3m³

Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 24 de Julio de 2024.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	1 m ³
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros: residuos domésticos	2 m ³

Total 3 m³

Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

Ismael Cortinas

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel. 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.T. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 8284

DIA	MESES	AÑO
23	5	24

CLIENTE: Cujo SA.

DIRECCIÓN: Ruta 23 -

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS:

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.:

FIRMA: Alberto Rojas

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel. 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.T. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 8281

DIA	MESES	AÑO
8	5	24

CLIENTE: Cujo SA

DIRECCIÓN: _____

REFERENCIA: Ruta 23

N° DE BAÑOS:

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.:

FIRMA: [Signature]

VEHÍCULO:

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

Impresos BELLEN - Cel. 098 857 900
8201/9200 x 2 V. - 10/23 - N.O. 46053

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel. 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.T. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 8226

DÍA	MES	AÑO
26	6	25

CLIENTE: Pujó

DIRECCIÓN: Sarandí Norte 3 Km 136

REFERENCIA: Flores

N° DE BAÑOS:

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN:

C.I.:

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel. 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.T. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 8211

DÍA	MES	AÑO
12	6	25

CLIENTE: Pujó (Quimend)

DIRECCIÓN: Norte 23 - Km 126

REFERENCIA: 25 km de Total

N° DE BAÑOS:

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

Impresos BELEN - Cel. 098 857 900
8201-9200 x 2 V. - 10/23 - N.O. 46033

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel. 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.T. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 8293

DÍA	MES	AÑO
11	7	26

CLIENTE: Cojo SA

DIRECCIÓN: Avda 23

REFERENCIA: Rodriguez

N° DE BAÑOS:

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel. 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.T. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 8300

DÍA	MES	AÑO
27	7	26

CLIENTE: Cojo SA

DIRECCIÓN: _____

REFERENCIA: V. Rodriguez Avda 23

N° DE BAÑOS:

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____


Impresos BELEN - Cel. 098 857 900
8201/9200 x 2 V. - 10/23 - N.C. 46053



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

San José, 3 de setiembre de 2024

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°5 del contrato M/84 correspondiente al trimestre mayo-julio 2024 que presentara la empresa contratista JOSE CUJO SA.



Ing. MYRIAM GRILL
DIRECTOR DIVISION REGIONAL 9
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

SUSAN SALDIVIA

De: MYRIAM GRILL
Enviado el: martes, 3 de setiembre de 2024 06:05
Para: MTOP - Unidad Administracion Documental
Asunto: Para hacer Apia
Datos adjuntos: REG G 74 V01 5to ITGA M84 rev1_anexo.pdf; elevitga5.docx
Categorías: susan

Buenos días.

Adjunto documentos para iniciar expte y enviar a Ing. Goyeneche. Agradezco devolver número de apia.

Sds.
Myriam

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	03/09/2024 13:30:16	
Tipo:	Enviar	

Pase al Ing Goyeneche como esta dispuesto

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0004257-REG G 74 V01 5to ITGA M84 rev1_anexo.pdf	Sí
2	2024-10-3-0004257-elevitga5.docx	Sí
3	2024-10-3-0004257-mail.pdf	Sí

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000
Fecha:	28/11/2024 11:33:36
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de la obra M-84 periodo mayo - julio 2024, el cual se remite a al UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	DNI - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	26/12/2024 17:31:00	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

VR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.-

Montevideo, 10 DIC. 2024

VISTO: que el Director Nacional de Vialidad de este Ministerio, Sr. Hernán Ciganda hará uso de su licencia reglamentaria durante el período comprendido entre el 20 de diciembre del corriente y el 17 de enero de 2025;-----

CONSIDERANDO: que es necesario asegurar la continuidad del funcionamiento de la precitada Dirección Nacional.-----

ATENTO: a lo expuesto.-----

EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

1°.- Encárgase interinamente del Despacho de la Dirección Nacional de Vialidad, a partir del día 20 de diciembre del corriente y hasta el 17 de enero de 2025, al funcionario de la citada Dirección Nacional, Ing. Civil Luis Alberto Silva Tejedor, Cedula de Identidad N° 1.861.822-9.-----

2°.- Delegase en el Ing. Silva la totalidad de las competencias y atribuciones oportunamente delegadas en el Sr. Director Nacional de Vialidad.-----

3°.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Vialidad a los efectos pertinentes.-----


José Luis Falero
Ministro de Transporte y Obras Públicas

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	03/01/2025 11:30:27	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento y consideración sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0004257-ENCARGATURA INTERINA DE DESPACHO DNI LUIS SILVA 2024-10-1-5089.pdf	Sí

Actuante:	
BENTANCUR SUAREZ, LORENA	
Pase a Firma	
SILVA TEJEDOR, LUIS	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	07/01/2025 15:21:54	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SILVA TEJEDOR, LUIS	07/01/2025 15:21:54	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	20/01/2025 22:06:55	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítase el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	21/01/2025 11:43:43	
Tipo:	Enviar	

DIRECCIÓN GENERAL

Pase a Administración Documental.

Teniendo en cuenta los informes precedentes, se remiten estas actuaciones a la CVU S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.

Firmante:
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2024-10-3-0004257
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	21/01/2025 12:00:19
Tipo:	Enviar

Pase a la Corporacion Vial del Uruguay SA

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN
